


사업기간	2022 ~ 2023							총사업비 (백만원)	85				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○		○		○		○				100%	
추진부서 (협조부서)	총무과 정보통신팀						담당자 (연락처)	강세리(5398)					
중앙정부 도움필요성		해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)											

□ 최종목표

- 군민광장 및 주요 관광지를 찾는 이용객에게 무료 와이파이 이용 편의성 제공
- 군민에게 디지털 접근성을 강화하고 손쉬운 인터넷 이용 환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 1. ~ 2022. 12. (연중)
- (사업위치) 군민광장, 우수영 등 주요 관광지 및 공공장소
- (사업량) 36개소 47회선
- (총사업비) 85백만원
 - 구축비: 85백만원(국비 70, 군비 15)
- (흐름도)

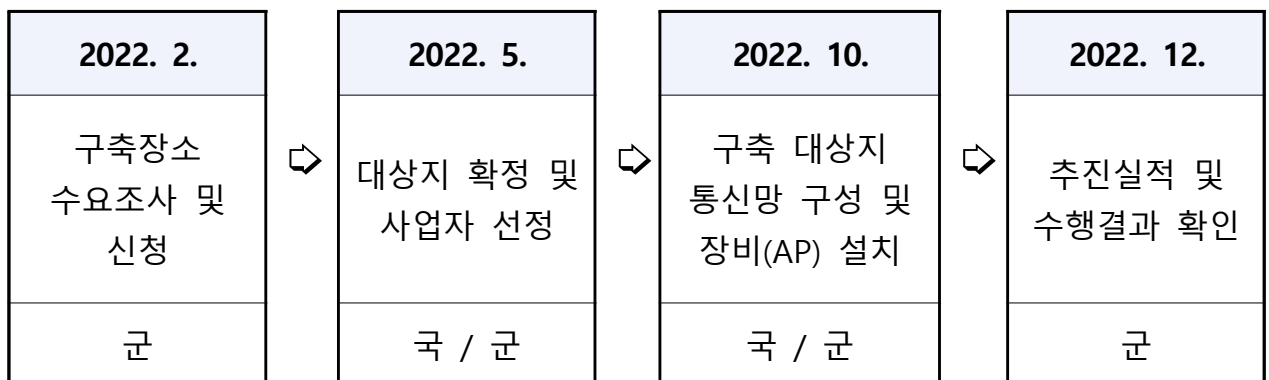

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공와이파이 구축 장소 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 35개소 44회선 신청 ○ 현장실사 후 통신망 구성 및 장비(AP)설치 <ul style="list-style-type: none"> - (과기부) 35개소 44회선 중 34개소 43회선 설치 완료('22. 12.) ※ 1개소(1회선) 구축 불가 ○ (자체구축) 군민광장 4회선 설치 완료('22. 12.) 	
2023 1/4분기	○ '22년 구축 공공와이파이 서비스 실시	
2023 2/4분기	○ '22년 구축 공공와이파이 매월 회선료 지급	
2023 3/4분기	○ '22년 구축 공공와이파이 매월 회선료 지급	
2023 4/4분기	○ '22년 구축 공공와이파이 매월 회선료 지급	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 구축한 공공장소 와이파이 현장점검 ○ 지속적인 주요 관광지 공공와이파이 구축장소 조사 	

□ 문제점 및 대책

- 황산면 농업인상담소(1회선) 면사무소 2층 이전으로 구축 불가

□ 기대효과

- 공공와이파이 서비스를 통해 이용객들의 모바일 통신비 절감과 정보 접근 확대
- 공공 와이파이 확충에 따른 관광지 정보와 원활한 데이터 이용 환경 조성
